



RAKŠANAS DARBU SHĒMA KOKA TUVUMĀ

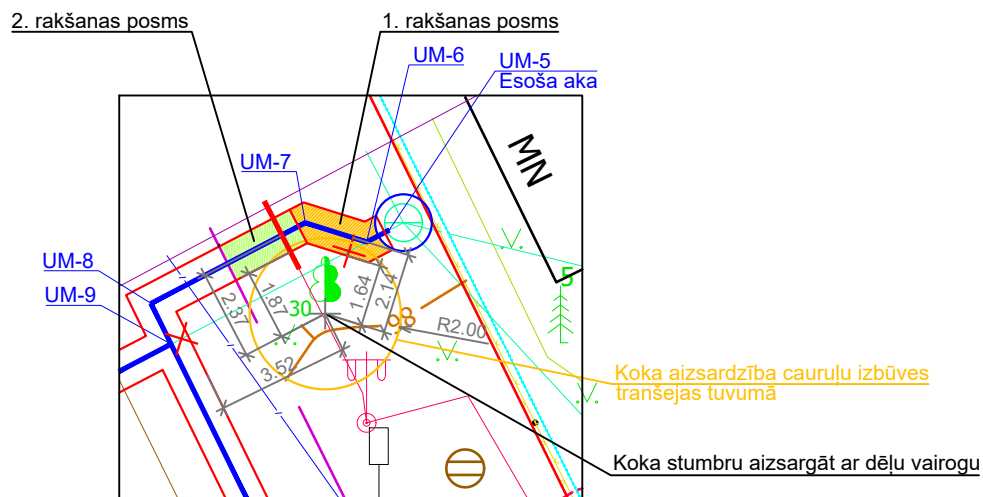

KOKA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI RAKŠANAS DARBU LAIKĀ

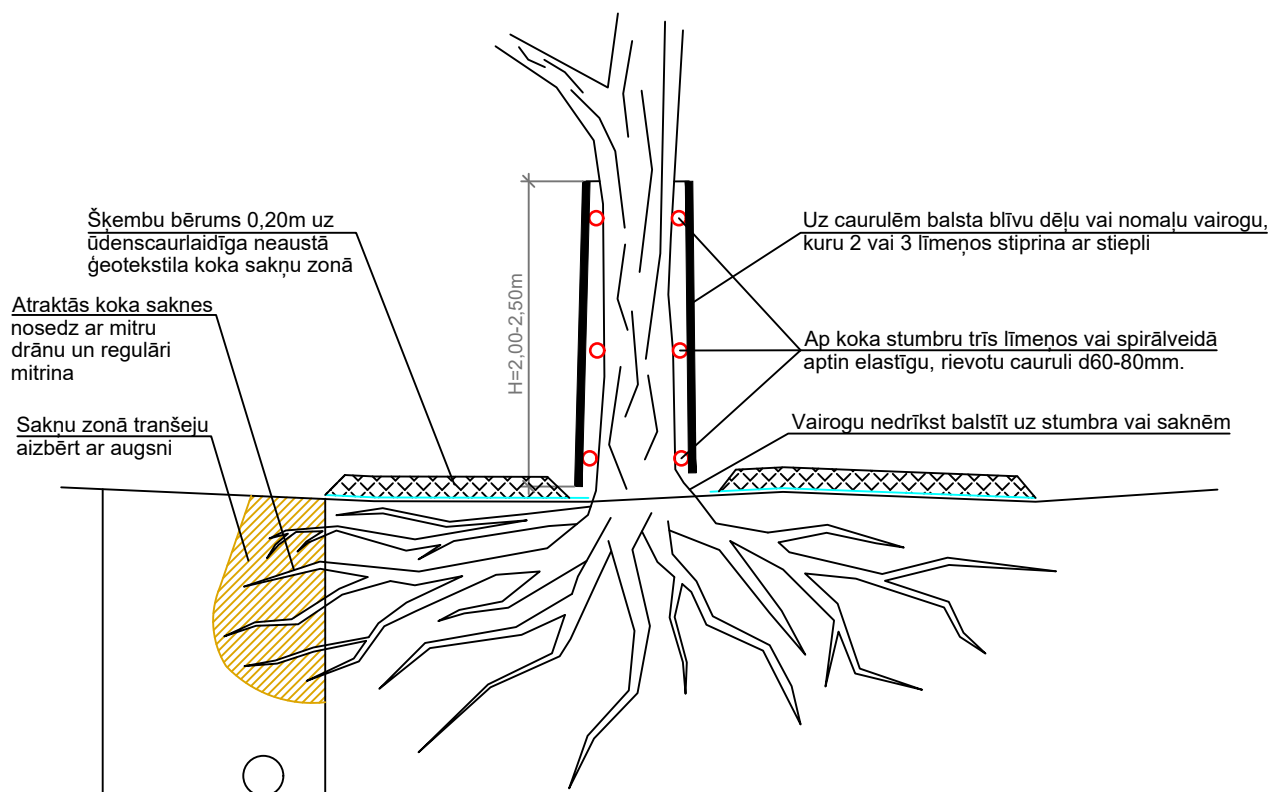

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas veic pasākumus koka stumbru un sakņu sistēmas aizsardzībai. Stumbru nosedz ar dēļu vai nomaļu vairogu 2,00-2,50 m augstumā. Koka sakņu zonā izklāj ūdenscaurlaidīgu neaustu ģeotekstilu, uz kura ber šķembas (neblietē). Šķembu bērumš paredzēts koka sakņu pasargāšanai no bojājumiem augsnes virsējā slānī.

Koka sakņu zonā rakšanas darbus veikt ar rokām. Lai saglabātu galvenās koka saknes, izrakt zemi zem tām un ļaut augšējam grunti slānim (starp saknēm) iebirt tranšējā. Kā alternatīvu rakšanas darbiem var izmantot gaisa lāpstu. Atsegtās saknes jāpiesedz ar mitru drānu, regulāri jāseko, lai tās neizžūtu. Kad tranšēju aizber, koka sakņu tiešā tuvumā aizbēršanai izmanto augsni, blietēšanu veic ar ūdeni.

3,0 m uz katru pusi no koka, tranšējas sienu iespējami attālināt no koka stumbru. Tranšēja gar pašu koku rokama pa posmiem (skat. shēmu). Vispirms jāizrok posms līdz koka stumbram, jāiegulda caurule un tranšēja jāaizber. Kad tas izdarīts, var atrakt tranšēju uz otru pusi no koka.

Rakšanas darbu laikā uzraudzīt koka stāvokli. Ja koks sāk svēties, nekavējoties pārtraukt darbus tranšējā un pieaicināt atbildīgos būvvaldes pārstāvjus, lai lemtu par tālāko rīcību. Neplānot rakšanas darbus koka tuvumā (3,00 m rādiusā no tā), ja gaidāms stiprs vējš.

Pēc būvdarbu pabeigšanas šķembu bērumu un ģeotekstilu novāc, dēļu vairogu noņem. Bojāto zālāja platību apber ar plānu augsnes kārtu (koka stumbru neapber) un sēj zālāju.

Projektētājs: Andris Bārdiņš Ser.Nr. 3-01629				Pasūtītājs: SIA "VINDA" Reģ. Nr. 49503000754, Valmieras 10, Cēsis, Cēsu nov.		Pasūtījuma Nr. :		
Būvprojekta vadītājs	A. Bārdiņš		20.07.2026	Būvprojekta nosaukums :		STADIJA	LAPA	LAPAS
Projektēja	L. Klokova		20.07.2026	Ūdensvada izbūve Mija un Dārza ielās, Liepā, Cēsu nov.		BP	9	12
				Rasējuma nosaukums:		Mērogs:	Marka:	
				Koku aizsardzība		b/m	UKT	
